DEPARTAMENTO DE GESTION VIAL

INFORME DE LABORES

Diciembre 2024/Octubre 2025

POÁS
GOBIERNO LOCAL



Arq. María Grettel Ugalde Murillo

Personal de Gestión Vial

Coordinadora



Arq. Grettel Ugalde

Promotora Social



Lic. Sandra López

Topógrafo



Ing. Andrey Víquez

Asistente Administrativa



Lic. Tatiana Rojas

Inspector de Obra Vial



Sr. Ricardo Chacón

Encargado Maquinaria



Sr. Carlos Murillo

Encargado Cuadrillas



Sr. Diego Sánchez



Personal Fijo 8 Personas

Raúl Gómez Goméz
Carlos León Vargas
Lizandro Cortes Rustrian
Luis Sanchez Porras
Donald Saveedra Castro
Michael Porras Meléndez
José Cirilo Espinoza Solis
José Fabio Solis Alfaro



Personal Ocasional 19 Personas

TRABAJOS PROGRAMADOS 2025

PROYECTOS PROGRAMADOS	283
PROYECTOS EJECUTADOS	173
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	13
PROYECTOS PENDIENTES	97

TRABAJOS POR EJECUTAR

MURO DE GAVIONES EN SANTA ROSA

DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RIO PRENDAS EN CALLE SOLIS

TRABAJOS EN EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN DE CALLE EL CERRO
En Proceso

REHABILITACIÓN Y MANEJO DE AGUAS EN CALLE APESTEGUI 2-08-113-00
En proceso

PRESUPUESTO 2025

ORDINARIO	586.124.576,63
EXTRAORDINARIO	309.764.087,11
TOTAL	895.888.663,74

GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

Compras por SICOP

DEDUCCIONES DEL PRESUPUESTO	
Servicio de Mantenimiento	3.532.429
Compra de Llantas, aceites y filtros	13.055.782
Barandas Metálicas Flex Beam	3.775.000
Pintura para demarcación	1.278.900
Materiales Muro Gaviones	6.304.920
Herramienta y Ferreteros	8.095.923
Madera y sus derivados	8.600.000
Vehículo	18.950.400.000
Vagoneta	37.598.400
Lowboy de 12 TN	20.000.000
Dos Batidoras	6.000.000
Tanque Plástico Horizontal	1.180.419
Equipo de protección Personal	8.190.072
Equipo y mobiliario de oficina	5.800.000
Minerales y asfálticos	96.972.325.000



Proyectos Participativos Solicitados

PROYECTOS PARTICIPATIVOS PRESENTADOS EN LA JUNTA VIAL CANTONAL PERIODO (diciembre 2024- octubre 2025)							
MES	AÑO	P.P APROBADOS	P.P RECHAZADOS	PROYECTO	CAMINO	DSITRITO	SOLICITANTE
Diciembre	2024		1	18 ml acera, cordón y caño	RN	Sabana Redonda	Domingo Alvarez
Diciembre	2024	1		70 ml acera, cordón y caño	Calle El Sitio	San Rafael	ADI Calle El Sitio
Diciembre	2024	1		1000 ml cuneta revestida	Calle El Tigre	Sabana Redonda	Comité de Caminos
Febrero	2025	1		250 ml alcantarillado pluvial de 18"	Calle Liles	San Rafael	Comité de Caminos
Marzo	2025	1		3 cajas de registro	Calle El Sitio	San Rafael	ADI Calle El Sitio
Marzo	2025		1	24 ml acera, cordón y caño	Calle Tablones	San Juan	Adriana Peñaranda
Marzo	2025		1	10 ml repello de acera	Cuadrante Santa Cecilia	San Pedro	María Ortiz
Marzo	2025		1	29 ml de acera, cordón y caño	Calle Hogar Belén	San Rafael	Patricia Rosales
Abril	2025		1	35 ml de alcantarillado pluvial	Calle Hogar Belén	San Rafael	Arlette Agüero
Agosto	2025	1		50 ml de alcantarillado de 18", acera, cordón y caño	Calle Ratoncillal	San Rafael	Marcos Quesada
Octubre	2025	1		65 ml acera, cordón y caño	Calle Tablones	San Juan	Concejo de Distrito San Juan - Escuela
Octubre	2025	1		30 ml acera, cordón y caño	Calle Tablones	San Juan	Virginia Herrera
Octubre	2025		1	10 ml alcantarillado de 18", acera, cordón y caño	Calle El Sitio	San Rafael	Luis Alfredo Barquero
Octubre	2025	1		480 ml de acera, cordón y caño	Calle Liles	San Rafael	Comité de Caminos
		8	6				

Proyectos Participativos Aprobados

PROYECTOS PARTICIPATIVOS EJECUTADOS PERIODO (diciembre 2024- octubre 2025)								
MES	AÑO	P.P APROBADOS		PROYECTO	CAMINO	DSITRITO	SOLICITANTE	COSTO EN COLONES
Diciembre	2024	1		70 ml acera, cordón y caño	Calle El Sitio	San Rafael	ADI Calle El Sitio	3382000
Diciembre	2024	1		1000 ml cuneta revestida	Calle El Tigre	Sabana Redonda	Comité de Caminos	20225500
Febrero	2025	1		250 ml alcantarillado pluvial de 18"	Calle Liles	San Rafael	Comité de Caminos	11242360
Marzo	2025	1		3 cajas de registro	Calle El Sitio	San Rafael	ADI Calle El Sitio	263950
Agosto	2025	1		50 ml de alcantarillado de 18"	Calle Ratoncillal	San Rafael	Marcos Quesada	2048550
Octubre	2025	1		65 ml acera, cordón y caño	Calle Tablones	San Juan	Concejo de Distrito San Juan - Escuela	168000
Octubre	2025	1		30 ml acera, cordón y caño	Calle Tablones	San Juan	Virginia Herrera	164800
Octubre	2025	1		480 ml de acera, cordón y caño	Calle Liles	San Rafael	Comité de Caminos	13652590
		7						¢51.147.750,00

Proyectos de Topografia

1	Acera El Faro	
2	Postes de Luz Cuesta Grande	
3	Marcar Acera Calle Reyes	
4	Invasión a Calle Pública 200 norte de la Escuela de C. Liles	
5	Marcar línea de Propiedad Santa Rosa, Camino a la Plaza	
6	Invasión a Calle Rampas 4 Esquinas	
7	Invasión a Calle Rampas 4 Esquinas	
8	Invasión de rampa de Acceso C. Alvarado	
9	Invasión a Acera por Bambú Frente Gimnasio Carrrillos	
10	Caso Árbol Calle Rufino	
11	Marcar línea de propiedad C. Potrero Chiquito ADI	
12	Rotonda en Calle Alvarado, replanteo de linderos	
13	Muro de gaviones Sabana Redonda	
14	Niveles Calle Solís, San Pedro	
15	Invasión por cercas eléctricas Cabuyal	
16	Invasión a Calle Pública Avenida 1	
17	Invasión a Calle Pública Avenida 1	
18	Marcar líneas de Propiedades Comité Calle Liles	
19	Marcar línea de propiedad Calle Apestigui	
20	Árbol en zona de nacientes, Calle Rufino	
21	Acera Kínder	
22	Invasión por muros de contención, Cristo Rey San Rafael	
23	Invasión por tapias y cochera, Cristo Rey San Rafael	
24	Calle Publica Urbanización La Senda	
25	Posteado de Luz, Calle Tajo Sabana Redonda	

26	Invasión Frente al Liceo de Poás
27	Invasión y descuaje frente entrada Calle Guadalupe
28	Invasión y descuaje Casmur, Calle Liles
29	Trámite para Visado, consulta de Calle Publica, C. Sitio
30	Invasión por rampas, Sabana Redonda Calle Tigre
31	Trámite para Visado, Camino no público
32	Daños a la vía pública por rampas de acceso, Calle Tapón
33	Niveles Calle El Cerro
34	Niveles contiguo Escuela San Juan Sur
35	Niveles Calle Corea
36	Levantamiento Bajo Zamora
37	Replanteo Bajo Zamora
38	Avalúo Vehículos Municipales
39	Análisis croquis de invasión de via
40	Croquis desfogue pluvial Santa Rosa
41	Tramite de minuta Calle Central Carrillos
42	Tramite de minuta Calle Zumbado Carrillos

	Pendiente
	En Proceso
	Terminado

PROYECCIÓN DE TRABAJOS DE LA UNIDAD TECNICA PARA 2025

- RECUPERACIÓN DE CAMINOS EN MAL O REGULAR ESTADO
- AMPLIACIÓN DE VIAS
- ALCANTARILLADOS DE PRIMERA NECESIDAD
- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ACERAS
- COMPRA DE VEHÍCULO Y VAGONETA
- INTERVENCIÓN DE PUENTES
- PROYECTOS PROGRAMADOS

Trabajos en Demarcación del Cantón

Todos los Distritos









PROYECTO DE RECARPETEO DE 1800 TM TONELADAS MÁS AMPLIACIÓN DE 373.39 TM PARA UN TOTAL DE INVERSIÓN DE ¢143.306.331,35


NÚMERO DE PROCEDIMIENTO 2024LD-000097-0022200208

PRODUCCIÓN, SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y ACABADO FINAL DE 1800 TM DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y 4320 M² PERFILADO EN DIFERENTES CAMINOS DEL CANTON DE POÁS

- ✓ Rendimiento Lineal 2200 metros lineales de nuevas carreteras
- ✓ Ejecutado en Enero 2025
- ✓ Realizado por la Empresa Pavicen



Recarpeteo Contratado para:

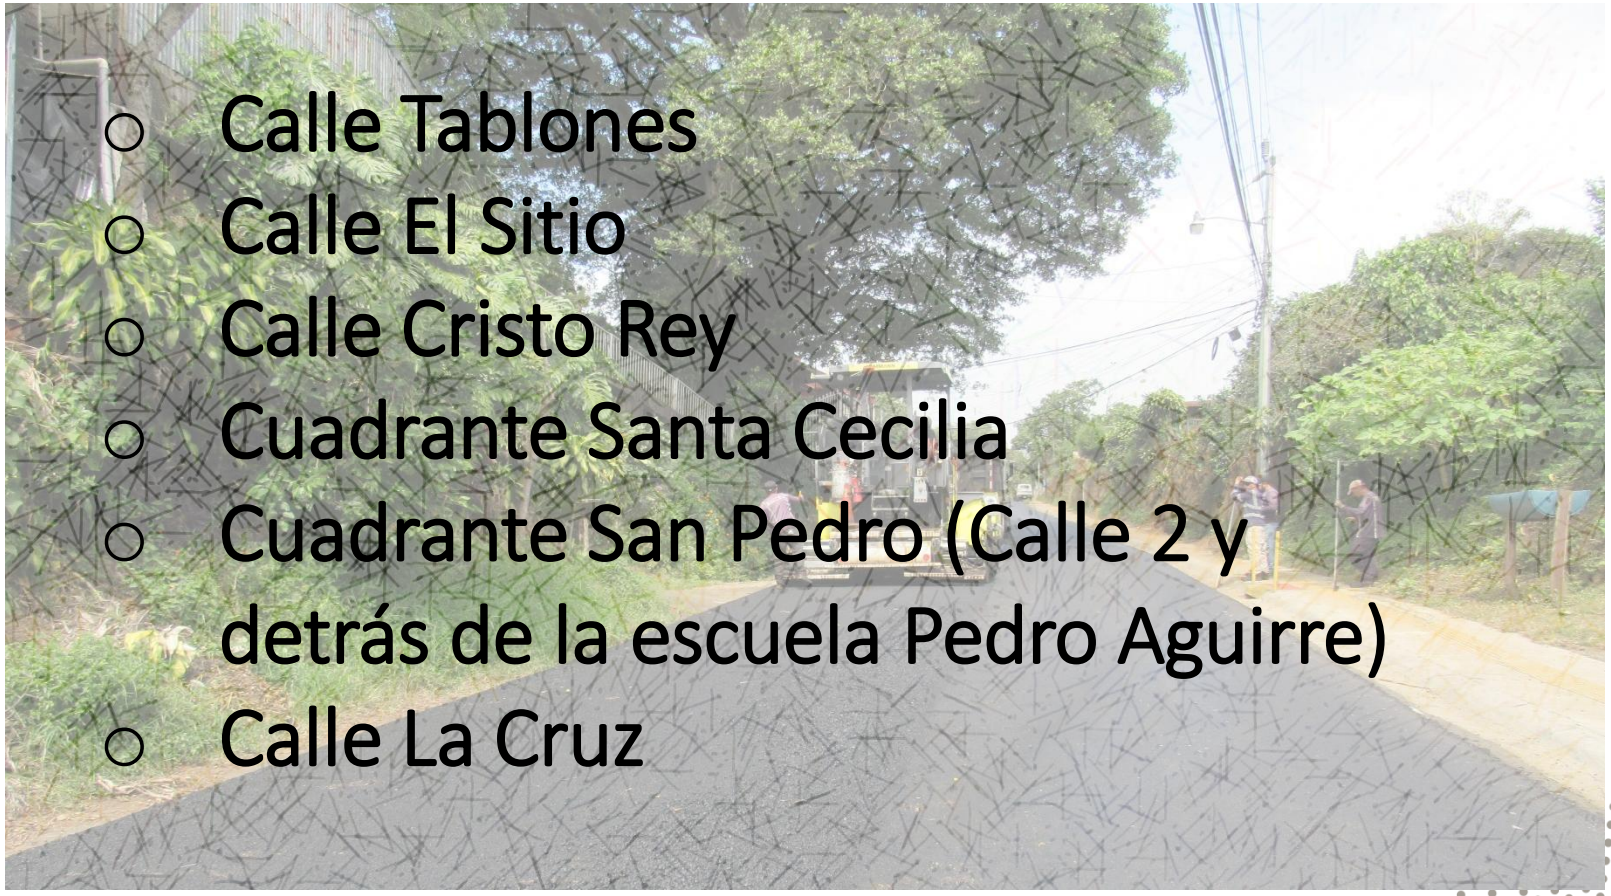

- Calle Tablones
- Calle El Sitio
- Calle Cristo Rey
- Cuadrante Santa Cecilia
- Cuadrante San Pedro (Calle 2 y detrás de la escuela Pedro Aguirre)
- Calle La Cruz

Recarpeteo Calle Tablones San Juan 350 ml





Recarpeteo San Rafael 950 ml



CALLE EL SITIO 300 ml



ENTRONQUE RUTA #107 CALLE CHURRUCA
Y CALLE CRISTO REY



CALLE CRISTO REY 650 ml

Recarpeteo San Pedro 600 ml



INICIO CALLE ENTRONQUE
CON RUTA #130



CALLE 2



FINAL CALLE ENTRONQUE
CON RUTA #146

Recarpeteo San Pedro otros Sectores 265 ml



CUADRANTE DE LA ESCUELA PEDRO AGUIRRE 115 ML



CUADRANTE SANTA CECILIA 150 ML

Recarpeteo
Calle La Cruz
Carrillos 500 ml



ENTRONQUE CON RUTA NACIONAL #118





GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

PROYECTO DE RECARPETEO DE 1867.96 TM Y PERFILADO DE 4136.40 M² MÁS AMPLIACIÓN DE 373.39 TM PARA UN TOTAL DE INVERSIÓN DE ¢145.579.985

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO 2025LD-000044-0022200208

PRODUCCIÓN, SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y ACABADO FINAL DE 1867.96 TM DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y 4136.40 M² PERFILADO EN DIFERENTES CAMINOS DEL CANTON DE POÁS



- ✓ Ejecutado en el mes de setiembre-octubre
- ✓ Rendimiento Lineal 2682 metros lineales de nuevas carreteras
- ✓ Realizado por la Empresa Pavicen

Recarpeteo Contratado para:

- Calle detrás de la Iglesia de Sabana Redonda
- Calle Linda Vista
- Calle Churruca
- Cuadrante San Pedro (Calle 0, Avenida 1, Avenida 4, Avenida 2,)
- Urbanización La Senda
- Calle La Cruz
- Calle Central Carrillos
- Calle Liles

GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

SAN PEDRO

recarpeteo de 656.85 tm



Proceso de Escarificación en Avenida #4



Trabajo Realizado

GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

SAN PEDRO

recarpeteo



CALLE 0 ENTRONQUES CON RUTA NACIONAL



AVENIDA #5



AVENIDA #2 FRENTE A LOS SERVICIOS
DE PRIMERA RESPUESTA

GESTIÓN V
MUNICIPALIDAD DE

CARRILLOS

recarpeteo de 209.73 tm




TOTALIDAD DE URBANIZACIÓN LA SENDA




CARRILLOS

recarpeteo

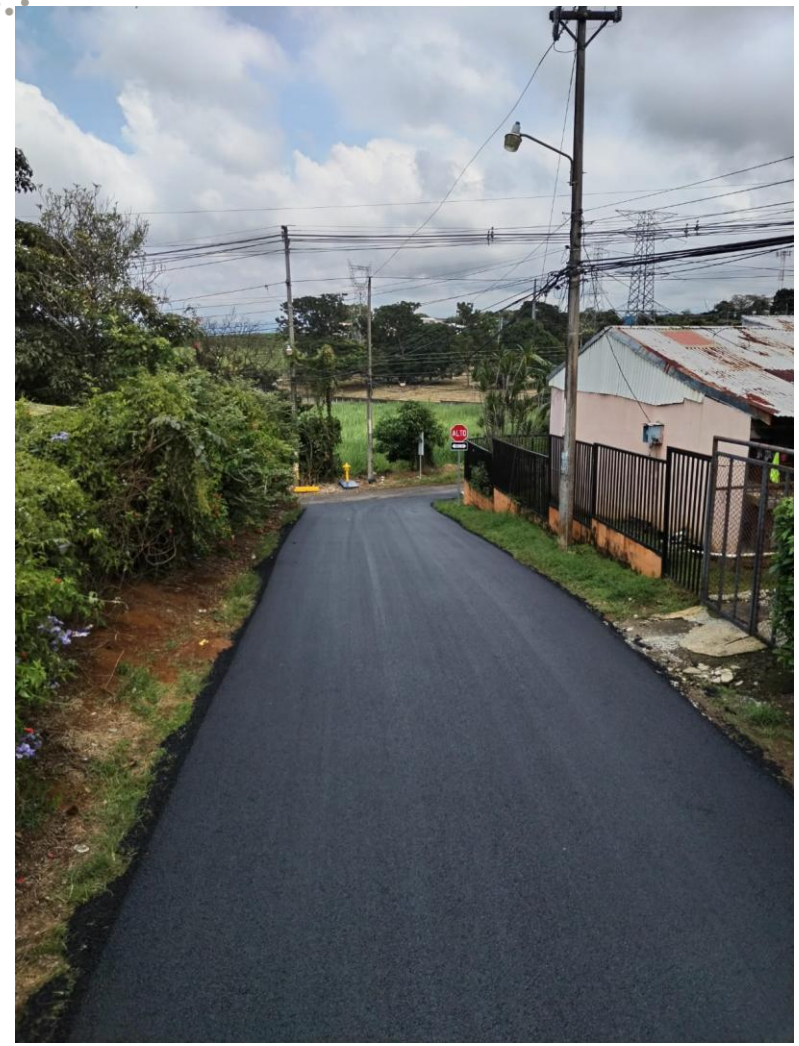

INGRESO A URB. LA SENDA

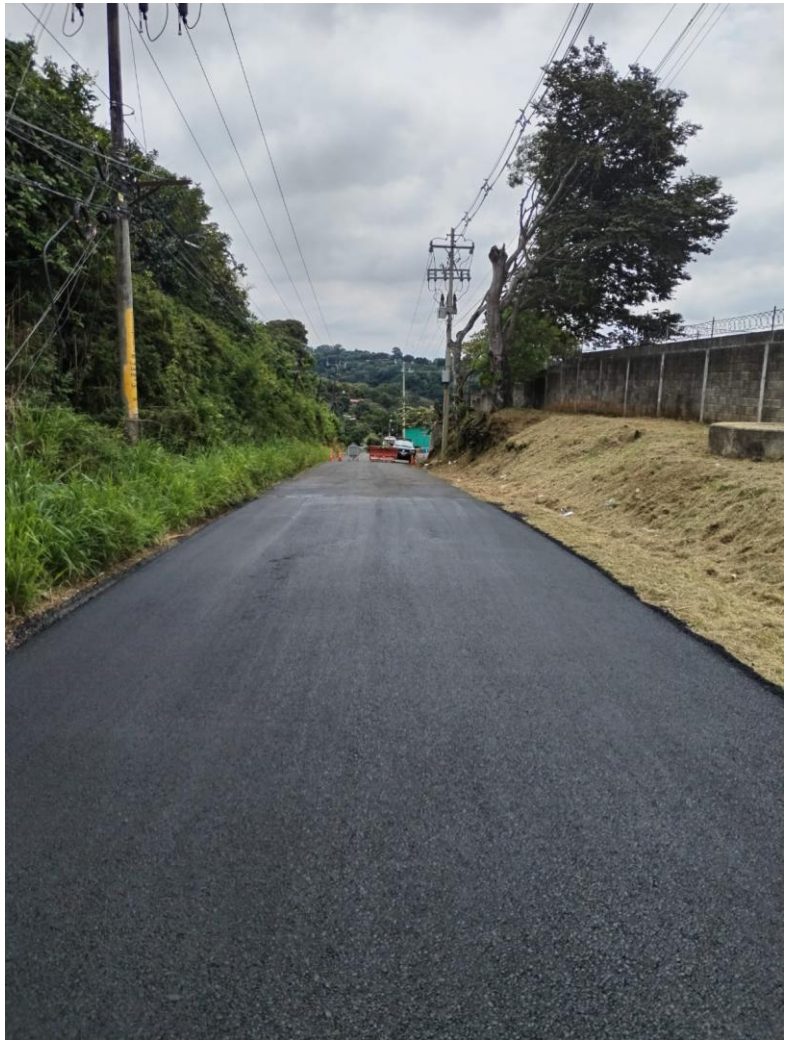

CALLE LA CRUZ

GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

SAN JUAN

recarpeteo de 153.83 tm





LA TOTALIDAD DE CALLE LINDA VISTA

GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

SAN RAFAEL

recarpeteo de 324.26 tm





CALLE CHURRUCA DESDE EL ENTRONQUE CON CALL CRISTO REY HASTA EL TALLER MECANICO

SABANA REDONDA

recarpeteo de 84.10 tm





CALLE DETRÁS DE LA IGLESIA DE SABANA REDONDA

Asfalto colocado por la Administración

SE HA REALIZADO UNA COMPRA DE 1300 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA

Recuento total de Proyecto Bacheo				
DISTRITOS	300 TM Colocadas	500 TM Colocadas	500 TM en ejecución	Totales
San Pedro	24.28	128.71	62.2	215.19
San Rafael	17.96	166.13	104.61	288.7
San Juan	60.35	87.56	4.4	152.31
Carrillos	197.41	25.19	116.33	338.93
Sabana Redonda		92.41	0	92.41

TOTAL DE MEZCLA ASFALTICA COLOCADA 1087.18 TM

TOTAL DE MEZCLA ASFALTICA FALTANTE 212.82 TM

Asfalto colocado por la Administración

- CALLE LA SENDA
- CALLE EL CERRO
- CALLE SAN JOSE
- CALLE SAN GERARDO
- CALLE CHURRUCA
- CALLE RATONCILLAL
- CALLE APESTEGUI
- CALLE EL LA LEGUA
- CALLE LA HILDA
- CALLE EL RINCON
- CALLE LA CRUZ
- CALLE CRISTO REY
- CALLE EL SITIO
- CALLE MURILLO
- CUADRANTES CARRILLOS BAJO
- CALLE MAXIMINO PORRAS
- CALLE GUATUZA
- CALLES DE RAMAZAL

CARRILLOS

Calle El Rincón

Código del Proyecto

PM-0002-25

Descuaje, limpieza de sistema pluvial, conformación de camino, recarpeteo de 100 tm y bacheo en Calle El Rincón

Costo del Proyecto

₡924,700.00





GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

CARRILLOS

Código del Proyecto

PM-0003-25

Descuaje, limpieza de sistema pluvial, conformación de camino, recarpeteo de 100 tm y bacheo de 15 tm en Calle El Rincón. Incluye ampliación de la calzada de rodamiento a 5 metros de ancho

Costo del Proyecto

₡9,824,700.00





CARRILLOS

Ampliación en Calle El Cerro





SAN RAFAEL

recarpeteo y bacheo

Colocación de 22 Tm de Partidas y 6 TM de Compra en Boca Planta

CÓDIGO DEL PROYECTO:

PM-0003-25

San Rafael, Santa Rosa, Calle Maximino Porras







GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

SAN JUAN

Código del Proyecto

PM-0111-25

Recarpeteo de 40 tm y en Calle Apestegui. Incluye ampliación de la calzada de rodamiento a 5 metros de ancho

Costo del Proyecto

₡9,824,700.00






Recuperación de Vía Pública en Calle Apestegui en San Juan

Entrada Finca La Vistada remover 40 metros cúbicos





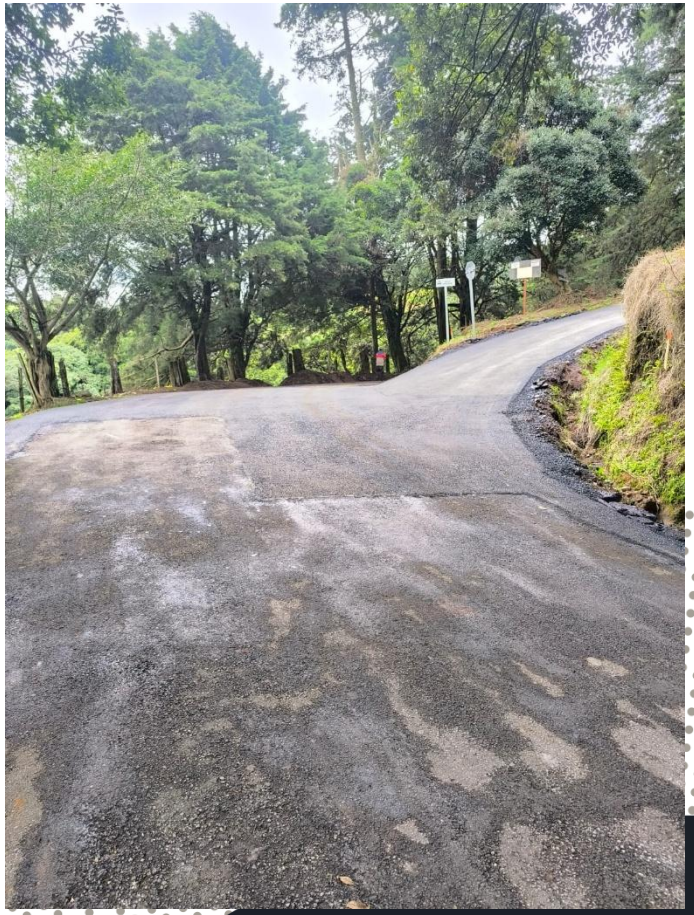

CARRILLOS

Bacheo en Calle San Gerardo







Proyecto Recuperación Calle Alpizar

Ubicación Sabana Redonda

Código del Camino	2-08-138
Código del Proyecto	Pm-0004-25 Boleta TM-3835
Duración del Proyecto	50 DÍAS
Costo Total	₡53.471.000
Longitud Camino	150 metros lineales
Trabajos Realizados	▪ Contratación de Maquinaria ▪ Conformación de Canal ▪ Colocación de alcantarillas de 32” ▪ Relleno y Nivelación ▪ Construcción de 4 Cajas de Registro ▪ Conformación del Camino ultimo tramo ▪ Canal abierto de llegada al río ▪ Manejo de aguas superficial ▪ Colocación de lastre al camino

Proyecto Recuperación Camino Calle Alpizar

Ubicación Sabana Redonda Camino 2-08-138 Largo Camino 150 ml





Fotografías antes de la intervención

Proyecto Recuperación Camino Calle Alpizar

Ubicación Sabana Redonda Camino 2-08-138 Largo Camino 150 ml




Maquinaria contratada para conformación del canal



Conformación de piso y colocación de tubos

Proyecto Recuperación Camino Calle Alpizar

Ubicación Sabana Redonda Camino 2-08-138 Largo Camino 150 ml

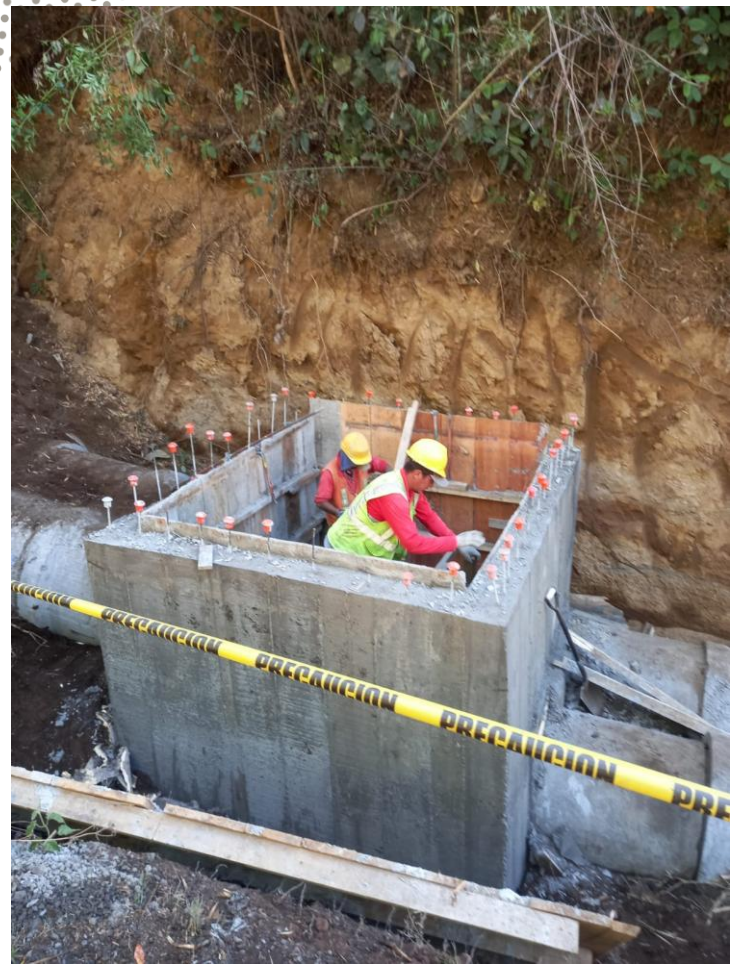



TRABAJOS PARA MANEJO DE AGUAS PROVENIENTES DE RUTA NACIONAL 146



GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

Proyecto Recuperación Camino Calle Alpizar

Viviendas que Colindan con el Desfogue



Condiciones de la parte final del camino público



Manejo de aguas superficiales



Nuevo acceso seguro

Proyecto Recuperación Camino Calle Alpizar

Ubicación Sabana Redonda Camino 2-08-138 Largo Camino 187 ml






Condiciones Actuales del Camino

Proyecto Recuperación Camino Calle Alpizar

Ubicación Sabana Redonda Camino 2-08-138

Largo Camino 187 ml



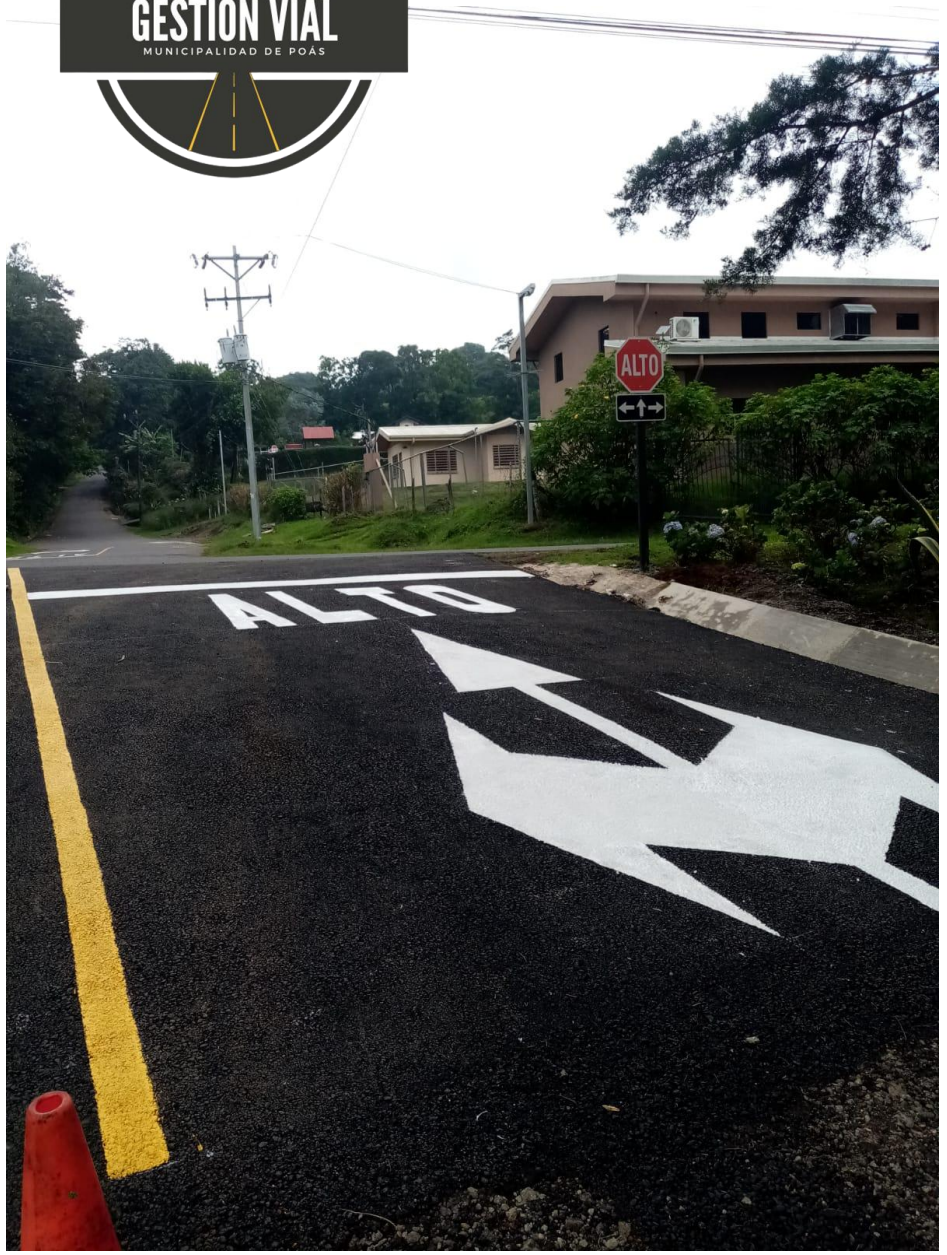

Proyecto Recuperación Camino El Avispero

Ubicación San Rafael Camino 2-08-138 Largo del Camino 2730 ml






- Recuperación Vía
- Descuaje y Limpieza
- Habilitar Sistema Alcantarillado
- Manejo de Aguas
- Estabilizar Pendientes



Proyecto Recuperación Calle Telón III

Ubicación Sabana Redonda Camino 2-08-046 Largo del Camino 1.250 ml

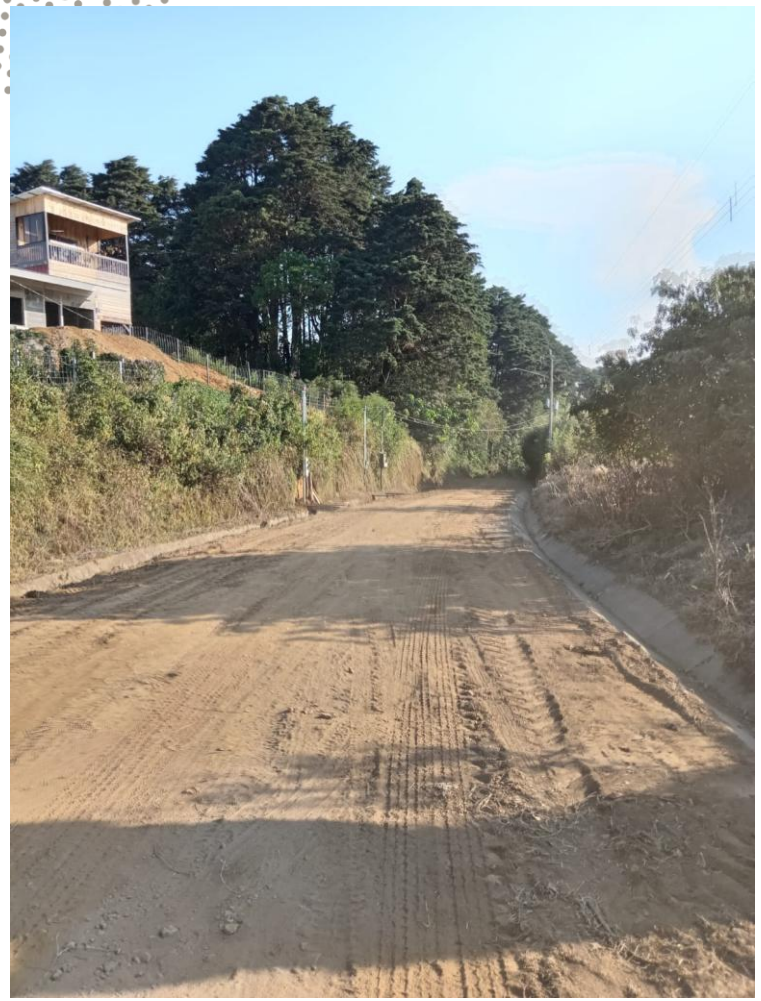

- Recuperación Vía
- Descuaje y Limpieza
- Conformación de Camino
- Rehabilitar Sistema Pluvial
- Colocación de Lastre
- Compactación



Proyecto de Reparación y Ampliación de Calle La Legua

Ubicación San Juan Norte Camino 2-08-022-00

Distancia Intervenida 95 ml Proyecto PM-0016-25



Colocación de 90ml de alcantarillas de 24” sencillas, 5 cajas de registro.

Limpieza de vía y ampliación en la misma distancia.

Proyecto Recuperación Calle Murillo

Ubicación San Pedro Camino 2-08-084 Largo del Camino 220 ml







- Recuperación Vía
- Descuaje y Limpieza
- Conformación de Camino
- Tratamiento
- Bacheo

Ampliación y Manejo de Aguas en Calle Liles







ACERAS SAN PEDRO





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS DE ACUERDO LEY 9976 DE MOVILIDAD PEATONAL

Propuesta de intervención de aceras en el cuandrante San Pedro, los colores indican el estado actual de la acera. Esta propuesta tomó en cuenta la afluencia petonal y vehicular para otorgar valores del 0 al 5 a las diferentes aceras.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ACERAS

Razones de Intervención

- Importancia de Conexión hacia centros de educación, salud, iglesias, y otros que centros concurridos
- Estado de deterioro que amerita su intervención por seguridad peatonal, como sectores quebrados, huecos, aceras resbaladizas, etc.
- Cantidad de elementos que obstaculizan el paso (rampas, desniveles, parrillas, hidrantes, rótulos, tuberías expuestas, ubicación de los hidrómetros, reparaciones de diversa índole)
- Cumplir en la medida de lo posible con la Ley 7600
- Estado de los caños quebrados que filtran las aguas y generan daños en la infraestructura vial, así como evitar aguas estancadas que propician roedores y malos olores

SAN PEDRO

Código del Proyecto

PM-0060-25

Construcción de acera en 25ml y recuperación de derecho de vía

Calle 2 San Pedro, entre Super El Faro y Agencia del PANI.

Boleta TM 3850


Costo del Proyecto

₡3,953,000.00







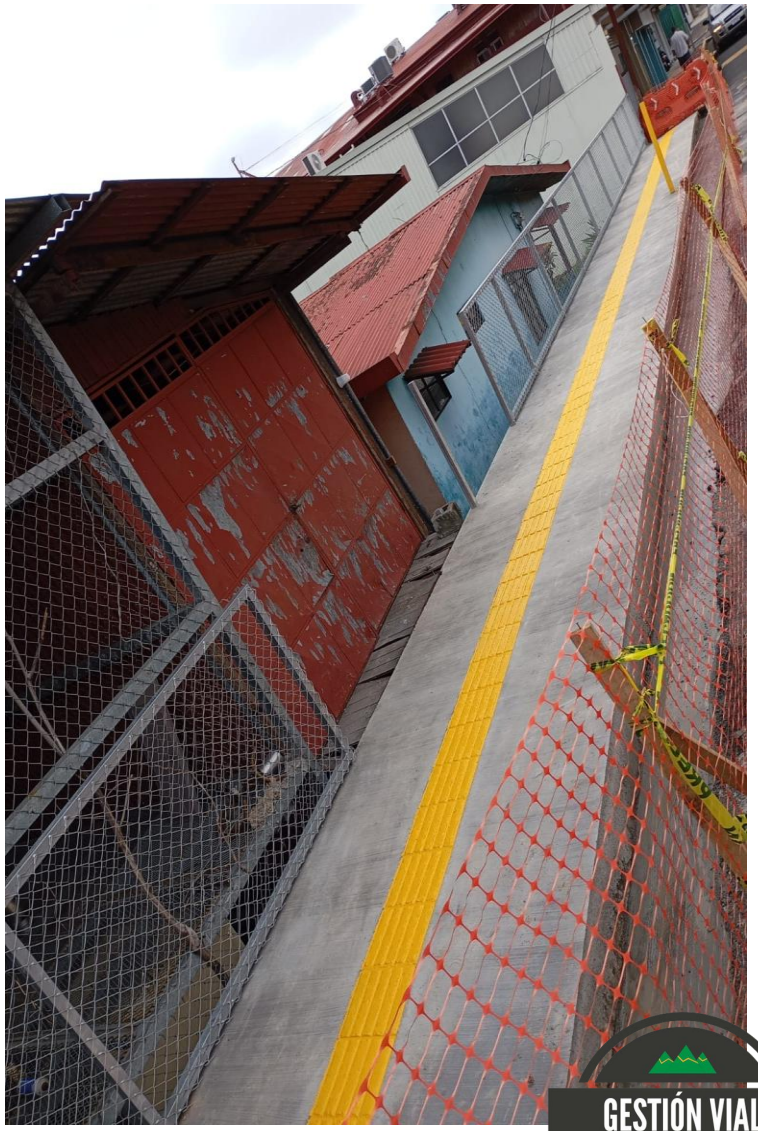

GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

SAN PEDRO

Código del Proyecto

PM-0098-25

Reconstrucción de acera, cordón y caño

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Cuadrante San Pedro

Longitud en 80 ml

Costo del Proyecto

₡5.716.000





SAN PEDRO

Código del Proyecto

PM-0098-25

Reconstrucción de acera, cordón y caño


Escuela Pedro Aguirre Cerda

Cuadrante San Pedro

Longitud en 80 ml

Costo del Proyecto


₡5.716.000

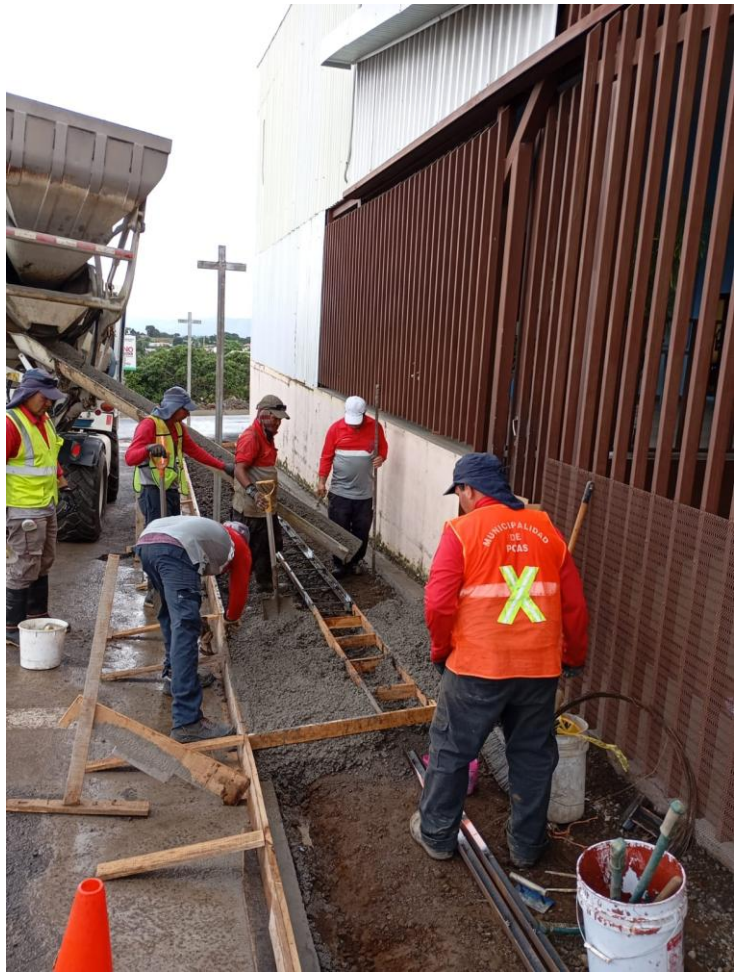



SAN PEDRO

Proyecto de Construcción Aceras en el Casco Central, Avenida 5

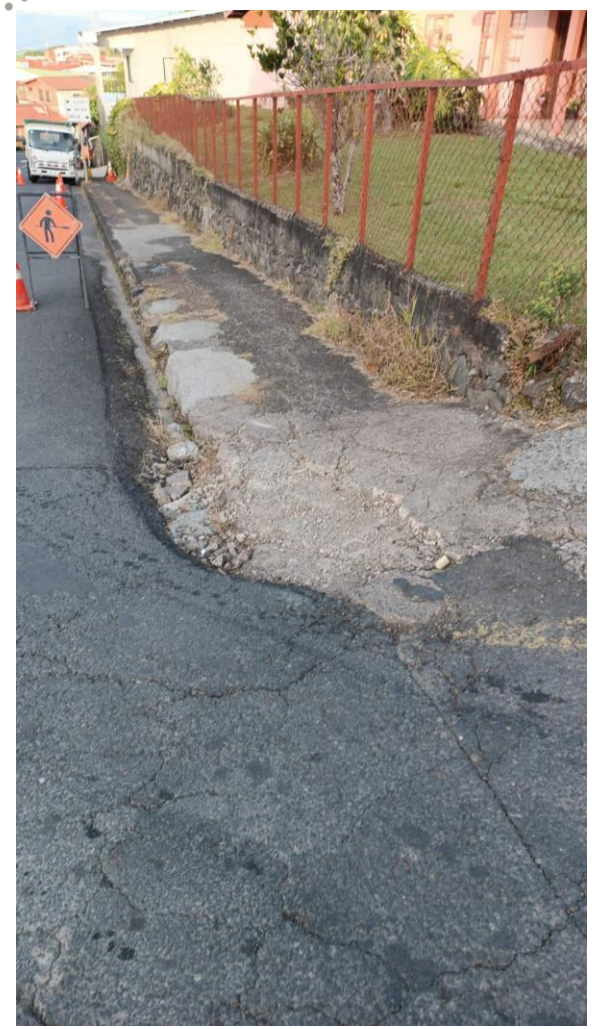



CARRILLOS

Código del Proyecto

PM-0104-25

Construcción de acera en 120 ml y recuperación de derecho de vía

Calle Reyes, costado oeste cruce de Calle La Mónica.

Costo del Proyecto

₡4,600,000.00





SAN RAFAEL

Proyecto de Reparación, Manejo de Aguas y Ampliación en Calle Cristo Rey

Ubicación San Rafael Camino 2-08-061-00

Distancia Intervenida 75 ml Proyecto PM-067-25








SAN PEDRO

Recuperación de vía pública en Avenida 1



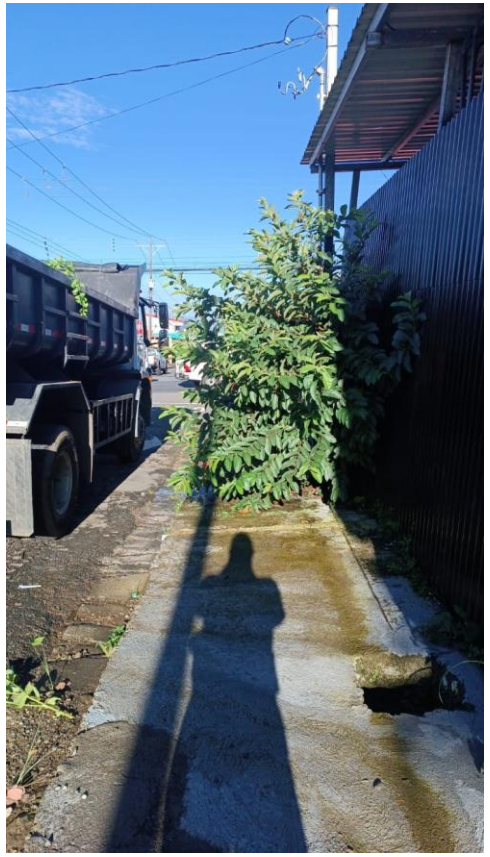



GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

SAN PEDRO

Código del Proyecto

PM-0114-25

Fecha de Inicio Lunes 14 de agosto

Recuperación de Vía Pública, construcción de acera, cordón y caño, asfalto y demarcación

Avenida #1

Cuadrante San Pedro

Longitud en 90 ml

Costo del Proyecto

₡3.353.600







SAN PEDRO

Código del Proyecto

PM-0154-25







Fecha de Inicio: Lunes 29 de Setiembre

Finaliza 29 de octubre

Santa Cecilia

Longitud en 112 ml, Construcción de acera, cordón y caño frente a la escuela

San Rafael

Código del Proyecto

PM-0136-25

Calle Liles

Longitud en 50 ml
Construcción de acera, cordón y caño y una caja de registro

Costo del Proyecto

₡2.250.000





Carrillos

Proyecto en Ejecución
Construcción de 70 ml de acera en Carrillos en el Parque Infantil







PROYECTOS
DE ALCANTARILLADO

SAN RAFAEL

Código del Proyecto

PM-0074-25

Proyecto Participativo entre Municipalidad de Poás y Comité de Caminos Calle Liles BoletaTM-3819

Construcción de alcantarillado y acera en 250ml

Costo del proyecto

₡21,000,000.00







GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

SAN PEDRO

Código del Proyecto

PM-0118-25


Remplazo de tubería fallada por tubería de 24" en 285 ml con pozos pluviales en calle Tino Herrera

Costo del proyecto

₡6.957.660.00





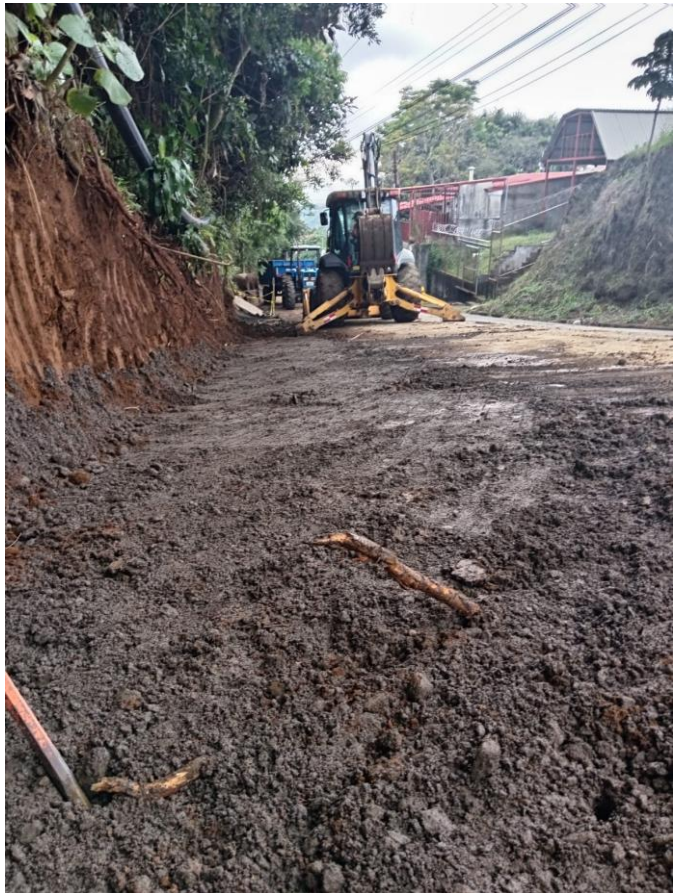

ALCANTARILLADO EN CALLE ALVARADO DISTRITO DE SAN JUAN



Código del camino:

2-08-039-00



Código del proyecto:

PM-0078-25



Duración del proyecto:

12 días



Longitud del proyecto:

50 ml



Costo del proyecto:

₡4,125,000.00







ALCANTARILLADO EN CABUYAL POR HUNDIMIENTO EN CALLE







50 metros de colocación de tubos de concreto de 24” con sus respectivas cajas de registro con ampliación de vía

SAN RAFAEL

Código del Proyecto

PM-0082-25

Entubado y construcción de cuneta revestida

Calle Churuca y calle Santa Rosa al lado derecho.

Boleta TM-3875

Costo del proyecto

₡5,070,050.00








GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

Excavación de alcantarillado en ruta Nacional 130 con cruce calle 3

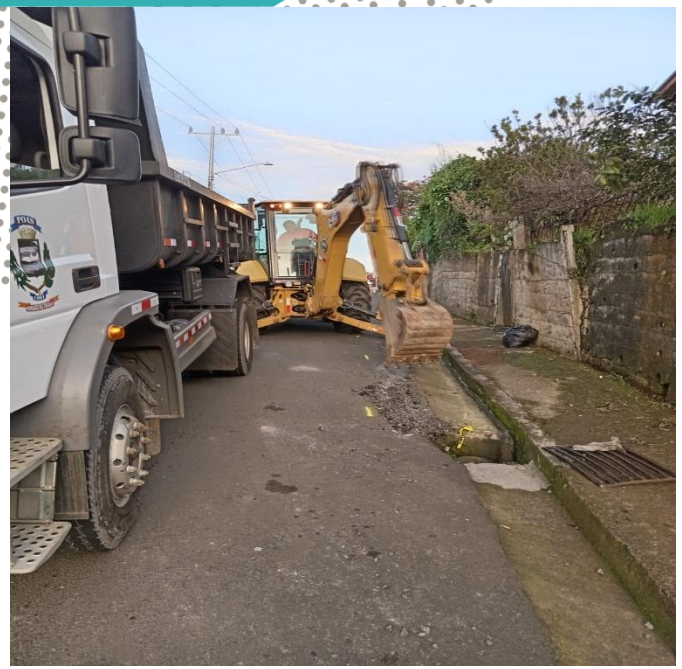






- 35ml alcantarillas 24“ C76
- Colocación de lastre
- Construcción de cajas de registro
- Colocación de asfalto 15 toneladas
- Construcción de cordón y caño

Código del proyecto:
PM-0088-25



Costo del proyecto:
₡3,870,000.00

GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POAS

Desfogue de Aguas en Barrio Los Angeles, San Pedro

PROBLEMATICA

- ❑ Intervención estaba iniciada pero inconclusa
- ❑ Problemas por filtraciones
- ❑ El sistema existente no era suficiente
- ❑ Aguas Estancadas

SOLUCIÓN

- ❑ Encausar aguas nuevamente con tubos Novaloc de 24”
- ❑ Construcción de 3 cajas de registro
- ❑ Construcción de un cabezal de desfogue





SAN PEDRO

Código del Proyecto

PM-0123-25

Construcción de caja de registro y cuneta revestida para solventar problemas de desfogue pluvial

Boleta TM-3696

San Pancracio, en el desfogue pluvial. Ver Boleta TM-3662

Costo del Proyecto

₡924,700.00





GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS



Mantenimiento de Caminos

Pintura de Reductores
Calle Tablones



GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

Señalización Vial





Colocación Barandas Flex Beam

Colocación de Arco
en Calle Rufino



PROYECTOS
DE EMERGENCIA



Remoción de árbol en
Calle Rufino



Reparación de Puentes de
Calle Rufino y Calle Zamora



Arreglo de hundimiento en
martillo final de Calle Carballo
ocurrido por emergencia.
Distancia 10 ml, tubería de
24". Tipo novalock



Proyecto de Construcción del Puente sobre el Río Poás

COSTO TOTAL DE LA OBRA 441,000,493.70

PAGO HASTA EL MOMENTO:

FACTURA #1 ₡ 110.535.262,15
FACTURA #2 ₡ 174.496.428.12
FACTURA #3 ₡ 48,710,987.35
FACTURA #4 ₡ 42,030,382.65
FACTURA #5 ₡ 65,227,433.40

COORDINACIÓN CON LA CNE

- ✓ ELABORACIÓN DE INFORMES A LA CNE
- ✓ INSPECCIONES DE OBRA
- ✓ TRAMITACIÓN DE FACTURAS


DOS AMPLIACIONES DEL PLAZO:

FECHA INICIAL 26 DE DICIEMBRE 2024
PRIMERA AMPLIACIÓN 25 DE ENERO DE 2025
FECHA DE ENTREGA 06 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INAUGURACIÓN OFICIAL EN ESPERA DE AGENDA

GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE POÁS

Proyecto de Construcción del Puente sobre el Río Poás



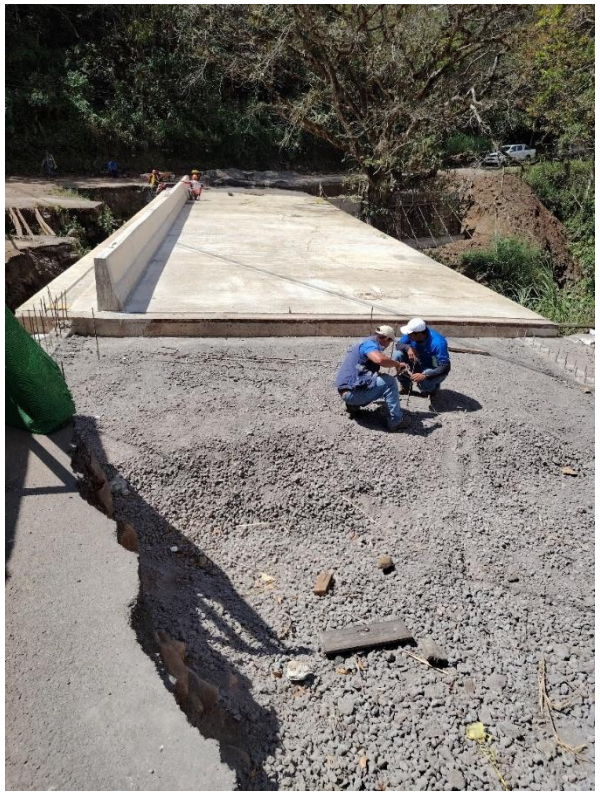







Proyecto sobre el Río Poás en Calle La Represa en Carrillos Municipalidad de Poás - CNE





Proyecto de Construcción del Puente sobre el Río Poás







POÁS

GOBIERNO
LOCAL

MUCHAS GRACIAS
